

ID	Nome attività	QUANTITA'	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	VARIANTE DI CERTALDO					
2	MOVIMENTI DI MATERIE					
3	CORPO STRADALE ASSE "A"					
4	Scavo di sbancamento		666 g	mer 16/05/07	mer 02/12/09	
5	Preparazione piano di posa		611 g	mer 16/05/07	mer 16/09/09	
6	Formazione completa di Rilevato		530 g	gio 14/06/07	mer 24/06/09	
7	CORPO STRADALE ASSE "B"					
8	Scavo di sbancamento		30 g	gio 14/06/07	mer 25/07/07	
9	Preparazione piano di posa		30 g	gio 26/07/07	mer 05/09/07 5	
10	Formazione completa di Rilevato		470 g	gio 06/09/07	mer 24/06/09 6	
11	CORPO STRADALE ASSE "B"					
12	Scavo di sbancamento		530 g	mer 16/05/07	mar 26/05/09	
13	Preparazione piano di posa		30 g	mer 16/05/07	mar 26/06/07	
14	Formazione completa di Rilevato		30 g	mer 27/06/07	mar 07/08/07 9	
15	CORPO STRADALE ASSI 31 e 32		470 g	mer 08/08/07	mar 26/05/09 10:27FI+5 g	
16	Scavo di sbancamento		530 g	gio 21/06/07	mer 01/07/09	
17	Preparazione piano di posa		30 g	gio 21/06/07	mer 01/08/07	
18	Formazione completa di Rilevato		30 g	gio 02/08/07	mer 12/09/07 13	
19	ASTA PRINCIPALE		470 g	gio 13/09/07	mer 01/07/09 14	
20	Scavo di sbancamento		580 g	gio 28/06/07	mer 16/09/09	
21	Preparazione piano di posa		30 g	gio 28/06/07	mer 08/08/07	
22	Formazione completa di Rilevato		30 g	gio 09/08/07	mer 19/09/07 17	
23	SVINCOLI CERTALDO OVEST		520 g	gio 20/09/07	mer 16/09/09 18	
24	Scavo di sbancamento		530 g	gio 28/06/07	mer 08/07/09	
25	Preparazione piano di posa		30 g	gio 28/06/07	mer 08/08/07	
26	Formazione completa di Rilevato		470 g	gio 09/08/07	mer 19/09/07 21	
27	VIADOTTO ARTIGIANALE					
28	Pali diam. 1200		652 g	mer 23/05/07	gio 19/11/09	
29	Scavo di Sbancamento		641 g	mer 23/05/07	mer 04/11/09	
30	Fondazioni	250*13	10 g	mer 23/05/07	mar 05/06/07	
31	Pile e Pulvini	11+2	80 g	gio 07/06/07	mer 20/06/07 26FI+1 g	
32	Appoggi	5*13	80 g	gio 21/06/07	mer 10/10/07 27	
33	Giunti		2 g	gio 19/07/07	mer 07/11/07 28FI-60 g	
34	Posa in opera di Travi		10 g	gio 08/11/07	ven 09/11/07 29	
35	Posa in opera di Coppelle		60 g	gio 22/10/09	mer 04/11/09 150	
36	Esecuzione di Impalcato		70 g	lun 19/11/07	ven 08/02/08 30FI+5 g:67	
37	VIADOTTO ASSE "A"					
38	Pali diam. 1200		593 g	lun 13/08/07	mer 18/11/09	
39	Scavo di Sbancamento		8 g	lun 13/08/07	mer 22/08/07 76FI+3 g	
40			2 g	gio 30/08/07	ven 31/08/07 36FI+5 g	

Progetto: Certaldo 17 04 07

Data: mar 10/11/09

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Pagina 1

ID	Nome attività	QUANTITA'	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
38	Fondazioni		5 g	lun 03/09/07	ven 07/09/07 37											
39	Pile e Pulvini		7 g	lun 10/09/07	mar 18/09/07 38											
40	Appoggi		2 g	mer 19/09/07	gio 20/09/07 39											
41	Giunti		20 g	gio 22/10/09	mer 18/11/09 150											
42	Posa in opera di Travi		90 g	mer 10/10/07	mar 12/02/08 40											
43	Posa in opera di Coppelle		150 g	mer 12/12/07	mar 08/07/08 42FI-80 g;64FI+5											
44	Esecuzione di Impalcato		150 g	mer 23/01/08	mar 19/08/08 43FI-120 g											
45	VIADOTTO CASCIANI		630 g	gio 07/06/07	mer 04/11/09											
46	Giunti		10 g	gio 22/10/09	mer 04/11/09 150											
47	Posa in opera di Coppelle		50 g	gio 07/06/07	mer 15/08/07											
48	Esecuzione di Impalcato		50 g	gio 21/06/07	mer 29/08/07 47FI-40 g											
49	PONTICELLO L=12m		123 g	gio 28/08/08	lun 16/02/09											
50	Scavo di Sbancamento		10 g	gio 28/08/08	mer 10/09/08											
51	Fondazioni		20 g	ven 19/09/08	gio 16/10/08 84											
52	Spalle Sx		10 g	ven 17/10/08	gio 30/10/08 51											
53	Spalle Dx		10 g	ven 31/10/08	gio 13/11/08 52											
54	Appoggi		5 g	ven 14/11/08	gio 20/11/08 53											
55	Giunti		2 g	ven 21/11/08	lun 24/11/08 54											
56	Posa in opera di Travi		20 g	mar 25/11/08	lun 22/12/08 55											
57	Posa in opera di Coppelle		30 g	mar 23/12/08	lun 02/02/09 56											
58	Esecuzione di Impalcato		30 g	mar 06/01/09	lun 16/02/09 57FI-20 g											
59	CAVALCAVIA VIGNACCE		3 g	mer 18/07/07	ven 20/07/07											
60	Giunti		3 g	mer 18/07/07	ven 20/07/07											
61	VIADOTTO FONDOVALLE ELSA		652 g	mer 23/05/07	gio 19/11/09											
62	Giunti		20 g	ven 23/10/09	gio 19/11/09											
63	Posa in opera di Coppelle	22 campate	130 g	mer 23/05/07	mar 20/11/07											
64	Esecuzione di Impalcato		130 g	mer 06/06/07	mar 04/12/07 63FI-120 g											
65	VIADOTTO MULINACCIO		636 g	gio 14/06/07	gio 19/11/09											
66	Giunti		20 g	ven 23/10/09	gio 19/11/09											
67	Posa in opera di Travi		40 g	gio 14/06/07	mer 08/08/07											
68	Posa in opera di Coppelle		45 g	gio 06/09/07	mer 07/11/07 67;48FI+5 g											
69	Esecuzione di Impalcato		45 g	gio 20/09/07	mer 21/11/07 68FI-35 g											
70	OPERE D'ARTE MINORI		629 g	ven 08/06/07	mer 04/11/09											
71	SCATOLARE TOMBINI		155 g	gio 07/02/08	mer 10/09/08											
72	Scavo di Sbancamento		150 g	gio 07/02/08	mer 03/09/08											
73	Esecuzione di Scatolari e tombini	n°73	150 g	gio 14/02/08	mer 10/09/08 72FI-145 g											
74	Fornitura e posa di tubi in CLS		150 g	gio 14/02/08	mer 10/09/08 72FI-145 g											

Progetto: Certaldo 17 04 07

Data: mar 10/11/09

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

ID	Nome attività	QUANTITA'	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
75	BOTRI		629 g	ven 08/06/07	mer 04/11/09	
76	Pali diam. 1200		20 g	ven 08/06/07	gio 05/07/07 26FI+2 g	
77	Scavo di Sbancamento		5 g	gio 08/11/07	mer 14/11/07	
78	Spalle Sx		10 g	lun 12/11/07	ven 23/11/07 29FI+2 g	
79	Spalle Dx		10 g	lun 26/11/07	ven 07/12/07 78	
80	Appoggi		1 g	ven 19/10/07	ven 19/10/07	
81	Giunti		10 g	gio 22/10/09	mer 04/11/09 150	
82	Posa in opera di Travi		2 g	mer 20/08/08	gio 21/08/08 44	
83	Posa in opera di Coppelle		10 g	ven 22/08/08	gio 04/09/08 82	
84	Esecuzione di Impalcato		10 g	ven 05/09/08	gio 18/09/08 83	
85	GALLERIE		600 g	mer 23/05/07	mar 08/09/09	
86	GALLERIA MARCIGNANO		499 g	mer 23/05/07	lun 20/04/09	
87	Approntamento Piazzola di Lavoro		5 g	mer 23/05/07	mar 29/05/07	
88	Assemblaggio Cassero		10 g	mer 30/05/07	mar 12/06/07 87	
89	Demolizione pali del fronte		5 g	lun 28/05/07	lun 18/06/07 88	
90	Consolidamenti		420 g	mar 31/07/07	lun 09/03/09 121	
91	Scavo		420 g	mar 14/08/07	lun 23/03/09 121FI+10 g	
92	Spritz+centine		420 g	mar 14/08/07	lun 23/03/09 121FI+10 g	
93	Impermeabilizzazione		420 g	mar 14/08/07	lun 23/03/09 121FI+10 g	
94	Getti in Cfs		440 g	mar 14/08/07	lun 20/04/09 121FI+10 g	
95	Finiture		420 g	mar 14/08/07	lun 23/03/09 121FI+10 g	
96	Monitoraggi		420 g	mar 14/08/07	lun 23/03/09 121FI+10 g	
97	GALLERIA FOGNETO I		270 g	mer 23/05/07	mar 03/06/08	
98	Approntamento Piazzola di Lavoro		5 g	mer 23/05/07	mar 29/05/07 87II	
99	Assemblaggio Cassero		10 g	mer 30/05/07	mar 12/06/07 98	
100	Demolizione pali del fronte		5 g	mer 13/06/07	mar 19/06/07 99	
101	Consolidamenti		210 g	mer 01/08/07	mar 20/05/08 122	
102	Scavo		210 g	mer 15/08/07	mar 03/06/08 122FI+10 g	
103	Spritz+centine		210 g	mer 15/08/07	mar 03/06/08 122FI+10 g	
104	Impermeabilizzazione		210 g	mer 15/08/07	mar 03/06/08 122FI+10 g	
105	Getti in Cfs		210 g	mer 15/08/07	mar 03/06/08 122FI+10 g	
106	Finiture		210 g	mer 15/08/07	mar 03/06/08 122FI+10 g	
107	Monitoraggi		210 g	mer 15/08/07	mar 03/06/08 122FI+10 g	
108	GALLERIA FOGNETO II		300 g	mer 02/07/08	mar 25/08/09	
109	Approntamento Piazzola di Lavoro		5 g	mer 02/07/08	mar 08/07/08 107FI+20 g	
110	Assemblaggio Cassero		10 g	mer 09/07/08	mar 22/07/08 109	
111	Demolizione pali del fronte		5 g	mer 23/07/08	mar 29/07/08 110	

Progetto: Certaldo 17 04 07

Data: mar 10/11/09

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto









Attività esterne

Cardine esterno


Scadenza


Pagina 3


ID	Nome attività	QUANTITA'	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
112	Consolidamenti	220 g	mer 10/09/08	mar 14/07/09 124		
113	Scavo	220 g	mer 24/09/08	mar 28/07/09 124FI+10 g		
114	Spritz+centine	220 g	mer 24/09/08	mar 28/07/09 124FI+10 g		
115	Impermeabilizzazione	220 g	mer 24/09/08	mar 28/07/09 124FI+10 g		
116	Getti in CIs	240 g	mer 24/09/08	mar 25/08/09 124FI+10 g		
117	Finiture	220 g	mer 24/09/08	mar 28/07/09 124FI+10 g		
118	Monitoraggi	220 g	mer 24/09/08	mar 28/07/09 124FI+10 g		
119	PORTALI E IMBOCCHI	581 g	mar 19/06/07	mar 08/09/09		
120	Realizzazione Galleria Artificiale Marcign	30 g	mar 24/03/09	lun 04/05/09 96		
121	Realizzazione Galleria Artificiale Marcign	30 g	mar 19/06/07	lun 30/07/07 89		
122	Realizzazione Galleria Artificiale Fogneto	30 g	mer 20/06/07	mar 31/07/07 100		
123	Realizzazione Galleria Artificiale Fogneto	30 g	mer 04/06/08	mar 15/07/08 107		
124	Realizzazione Galleria Artificiale Fogneto	30 g	mer 30/07/08	mar 09/09/08 111		
125	Realizzazione Galleria Artificiale Fogneto	30 g	mer 29/07/09	mar 08/09/09 118		
126	SOVRASTRUTTURA STRADALE	405 g	gio 15/05/08	mer 02/12/09		
127	CORPO STRADALE ASSE "A"	50 g	gio 25/06/09	mer 02/09/09		
133	CORPO STRADALE ASSE "B"	50 g	mer 27/05/09	mar 04/08/09		
139	CORPO STRADALE ASSI 31 e 32	50 g	gio 02/07/09	mer 09/09/09		
145	ASTA PRINCIPALE	30 g	gio 10/09/09	mer 21/10/09		
151	SVINCOLI CERTALDO OVEST	25 g	gio 09/07/09	mer 12/08/09		
157	GALLERIE	45 g	mer 09/09/09	mar 10/11/09		
163	LAVORI DIVERSI DI FINITURA	405 g	gio 15/05/08	mer 02/12/09		


Progetto: Certaldo 17 04 07 Data: mar 10/11/09	Attività		Cardine		Attività esterne	
	Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
	Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	

Pagina 4

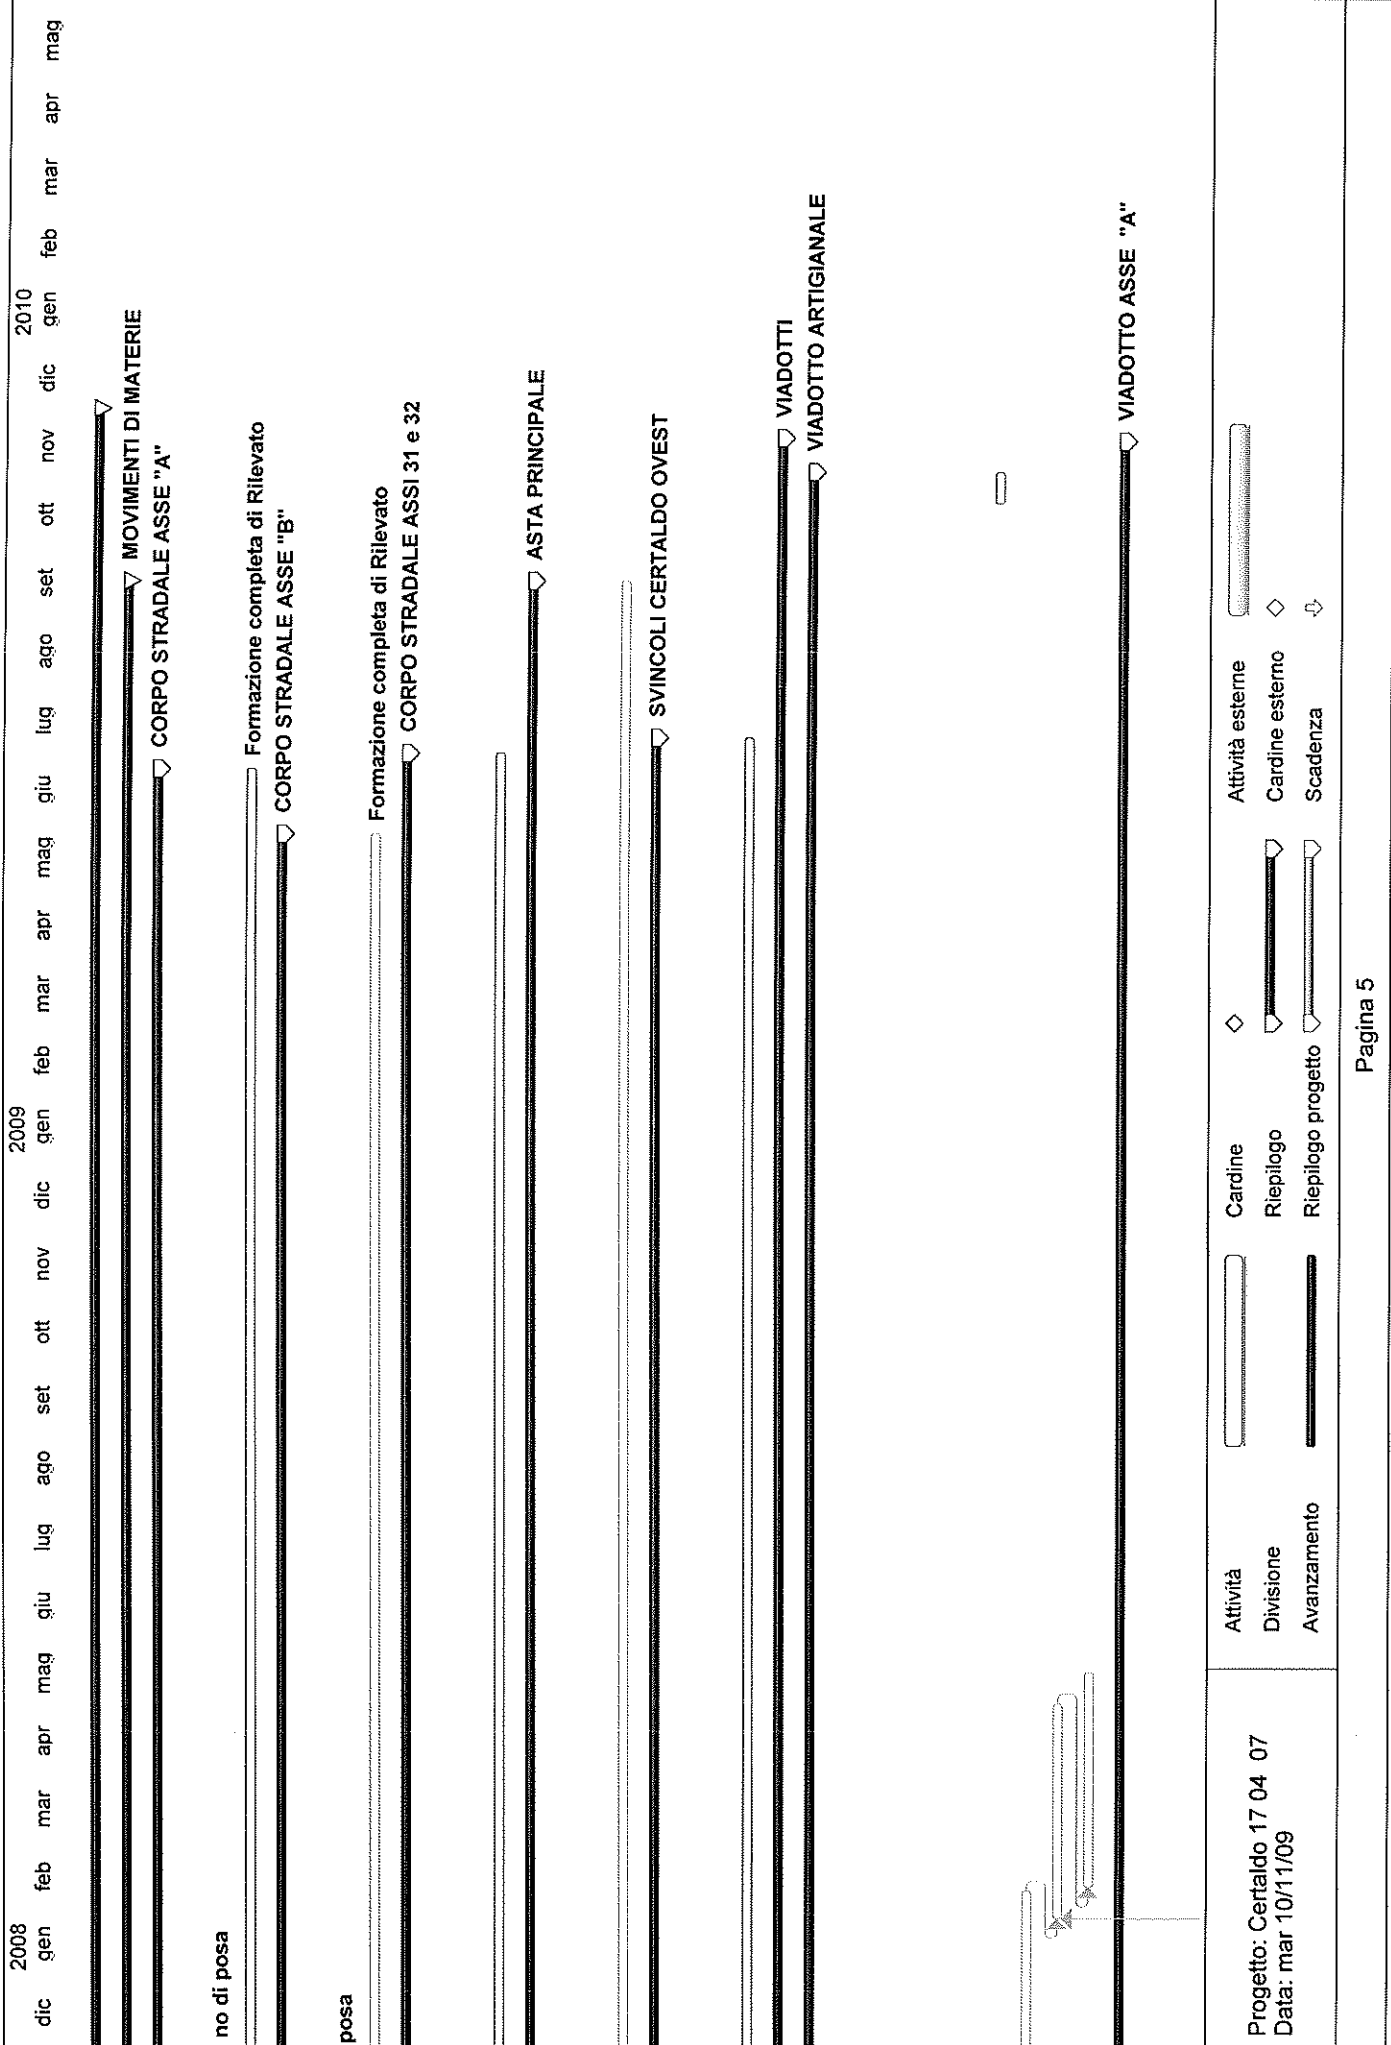

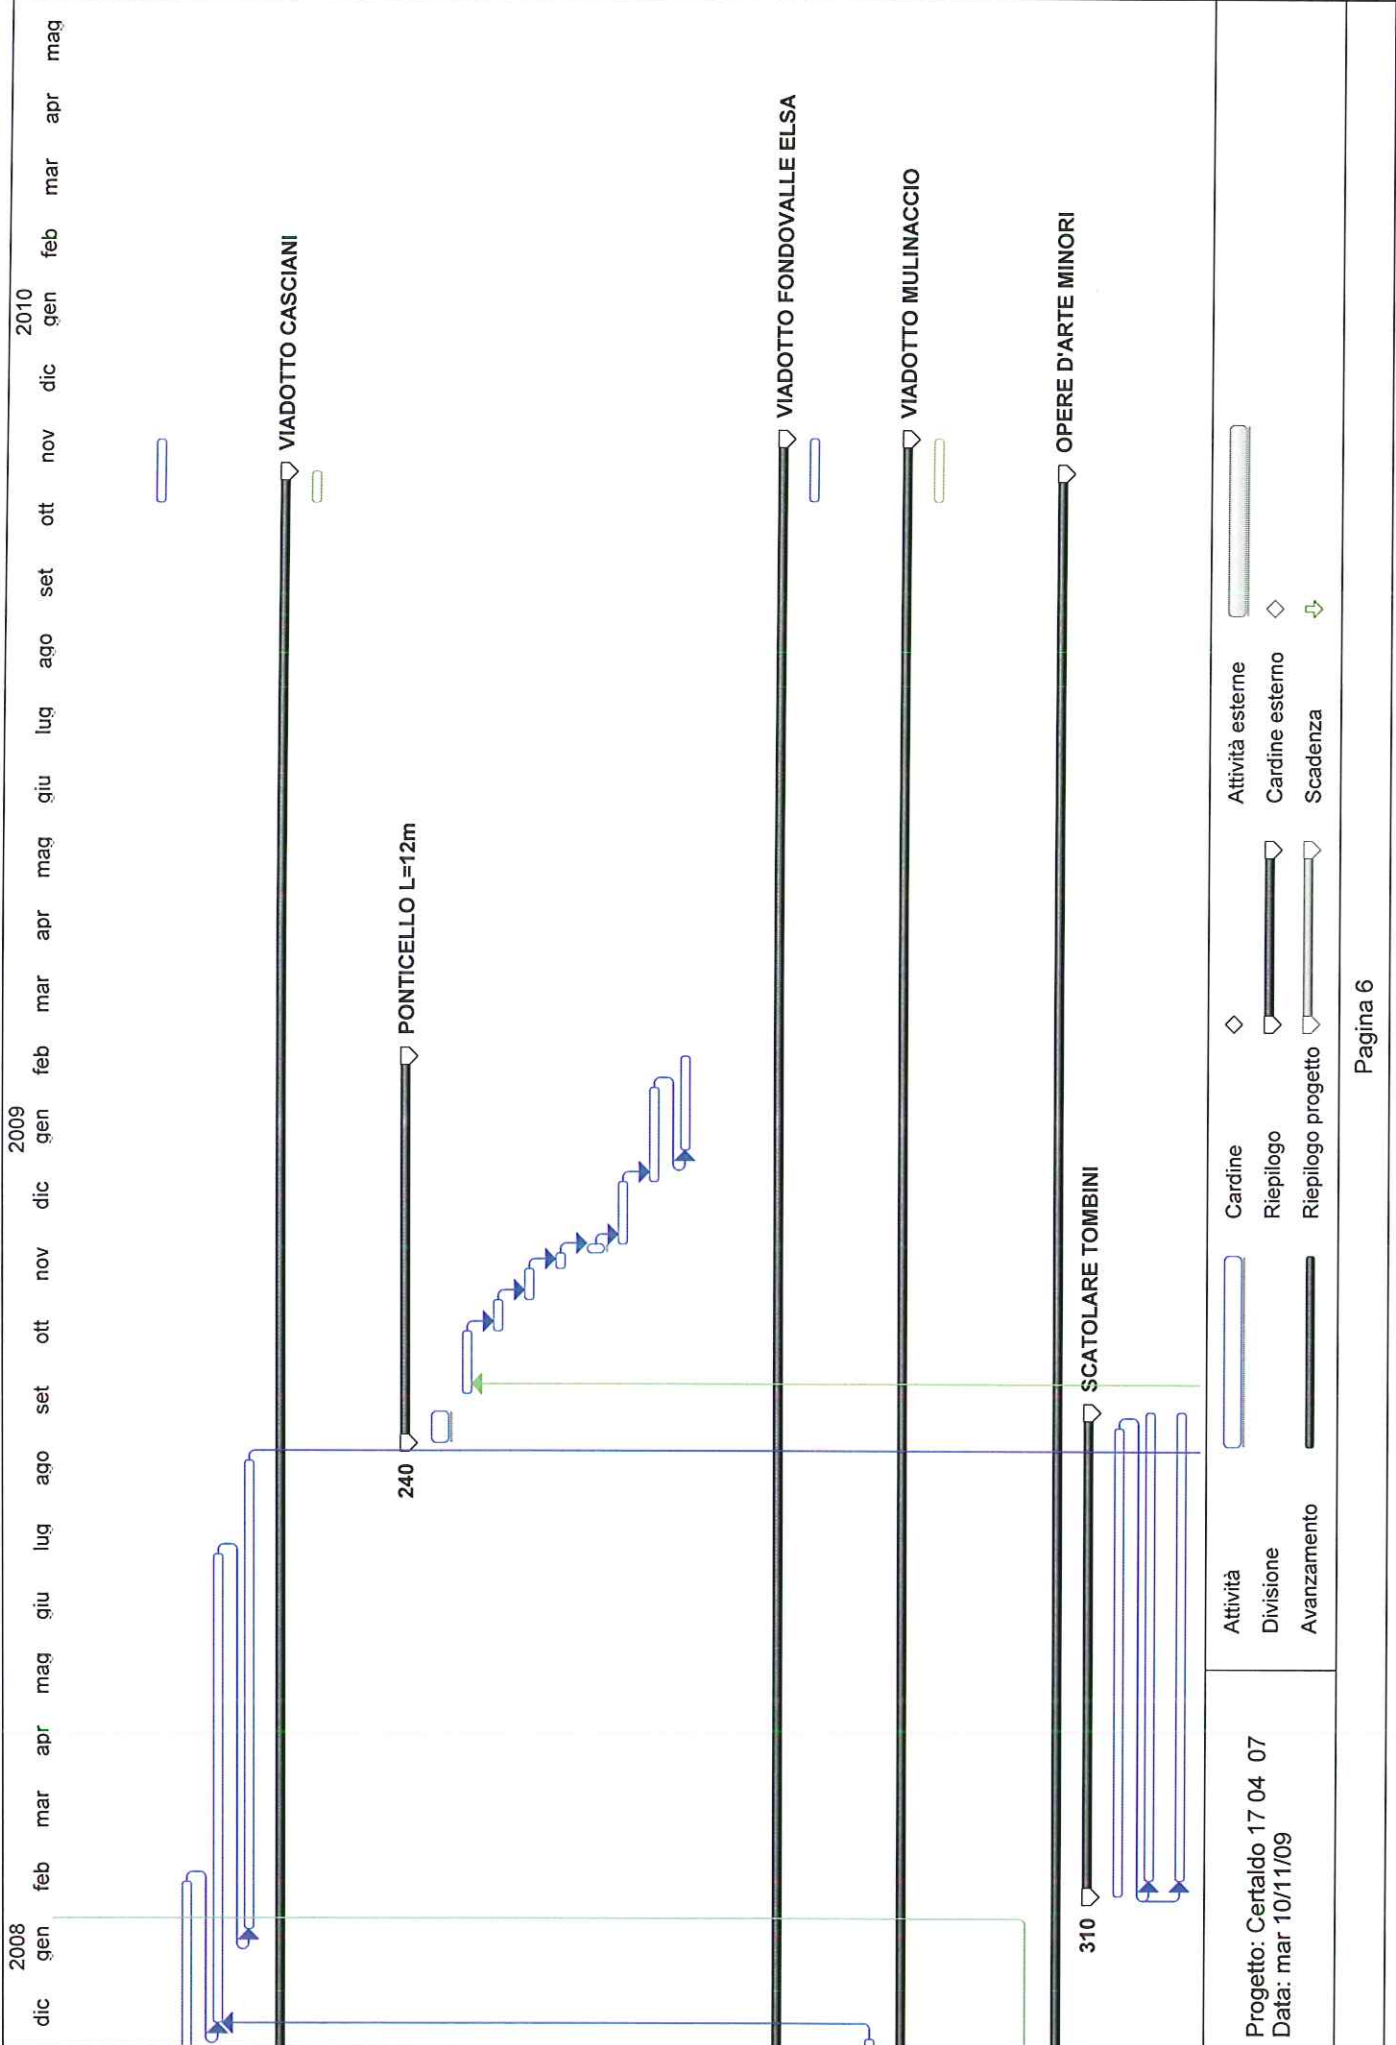

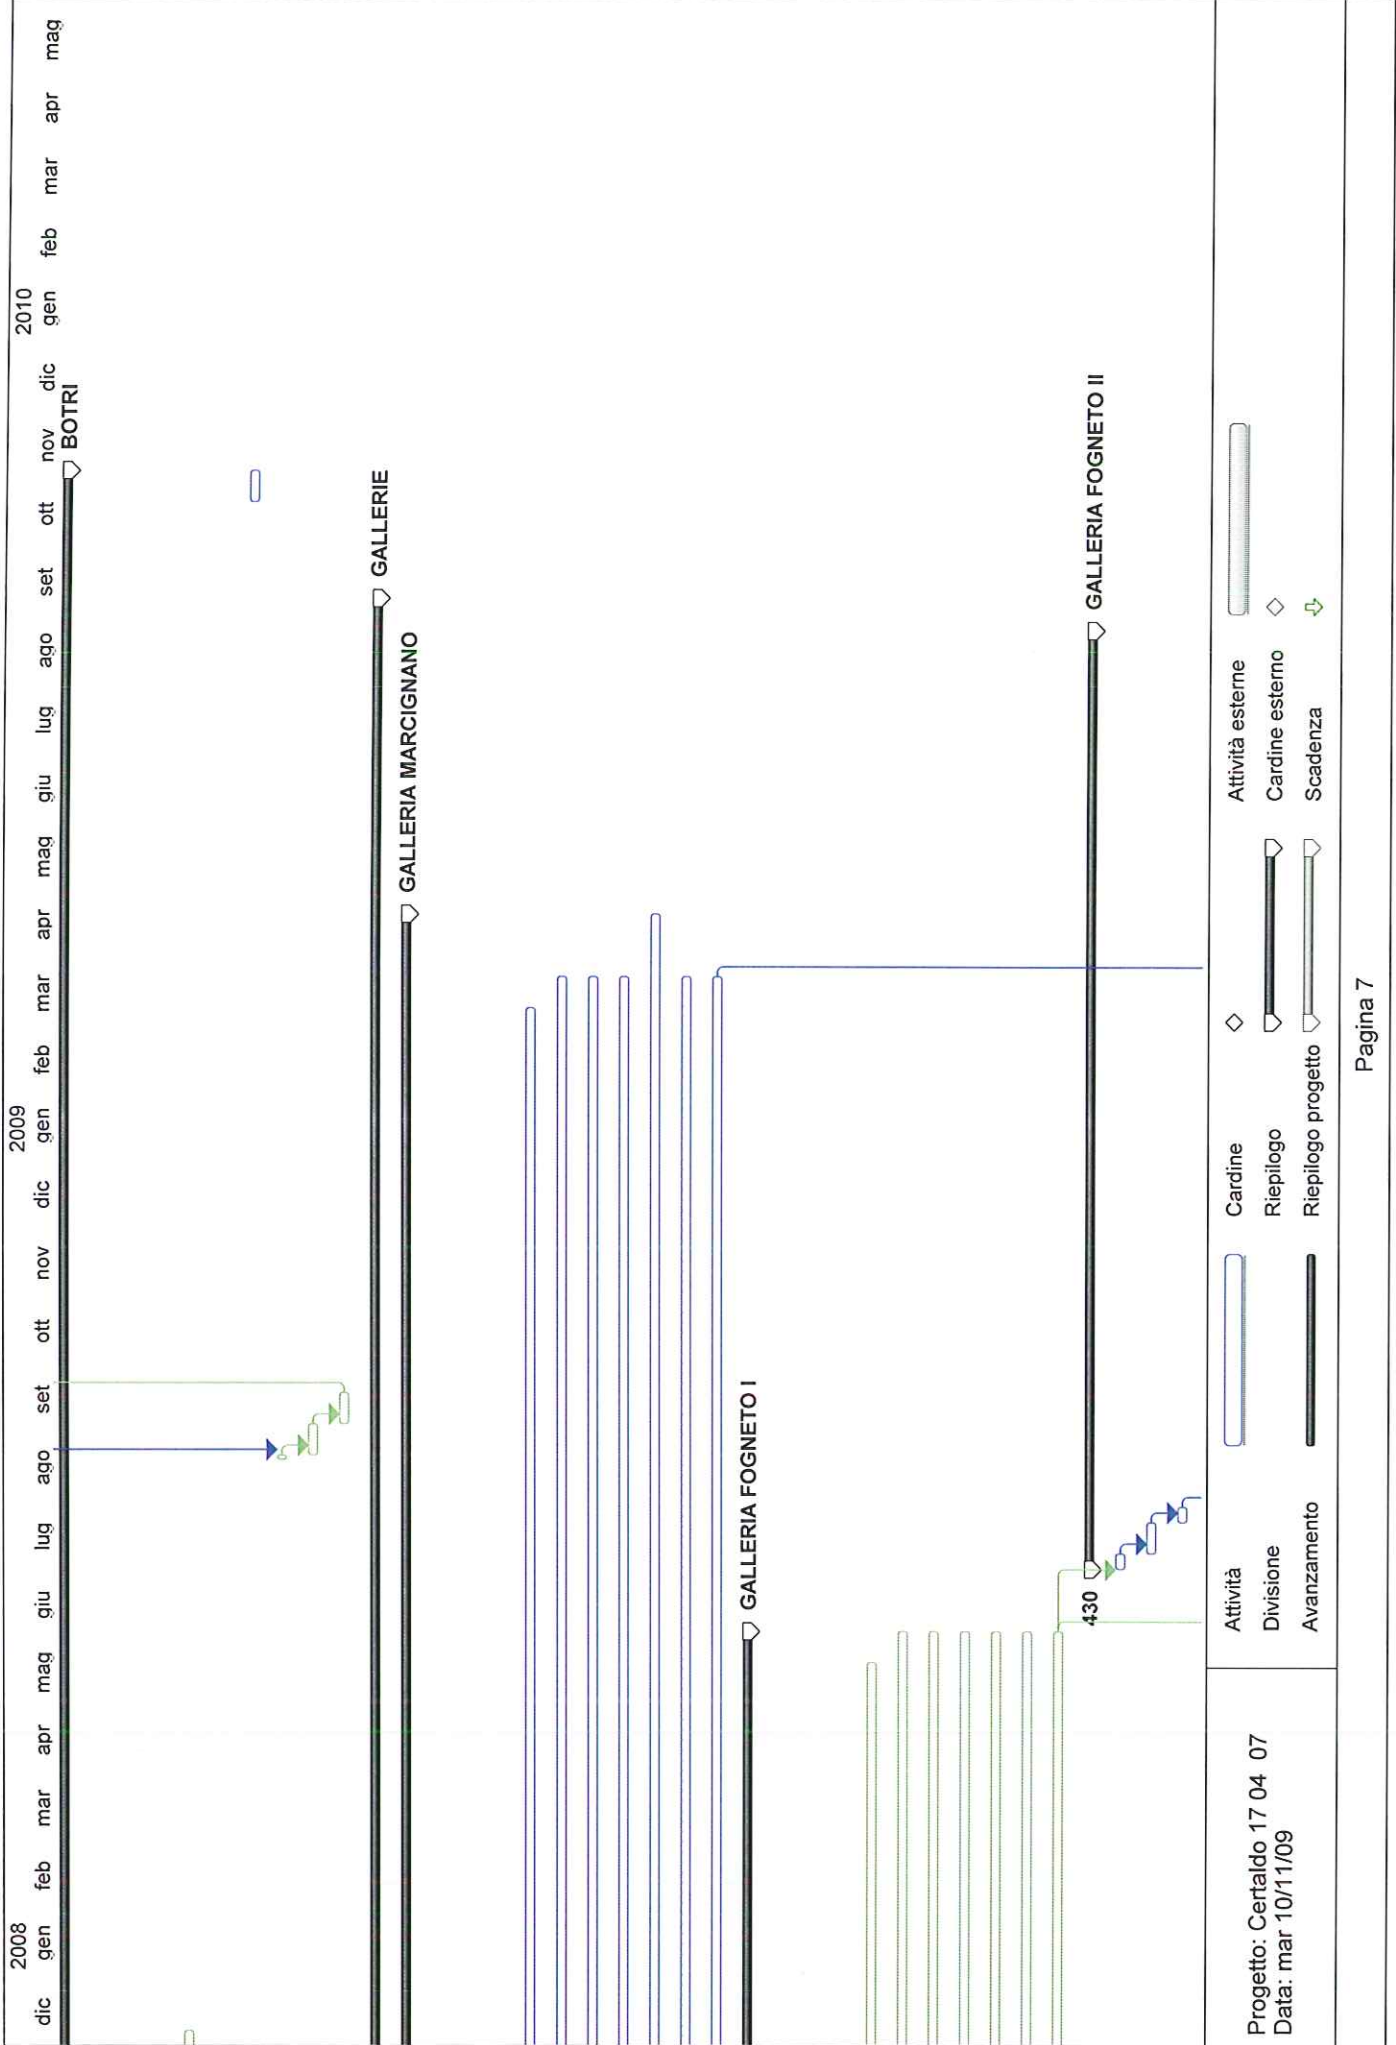

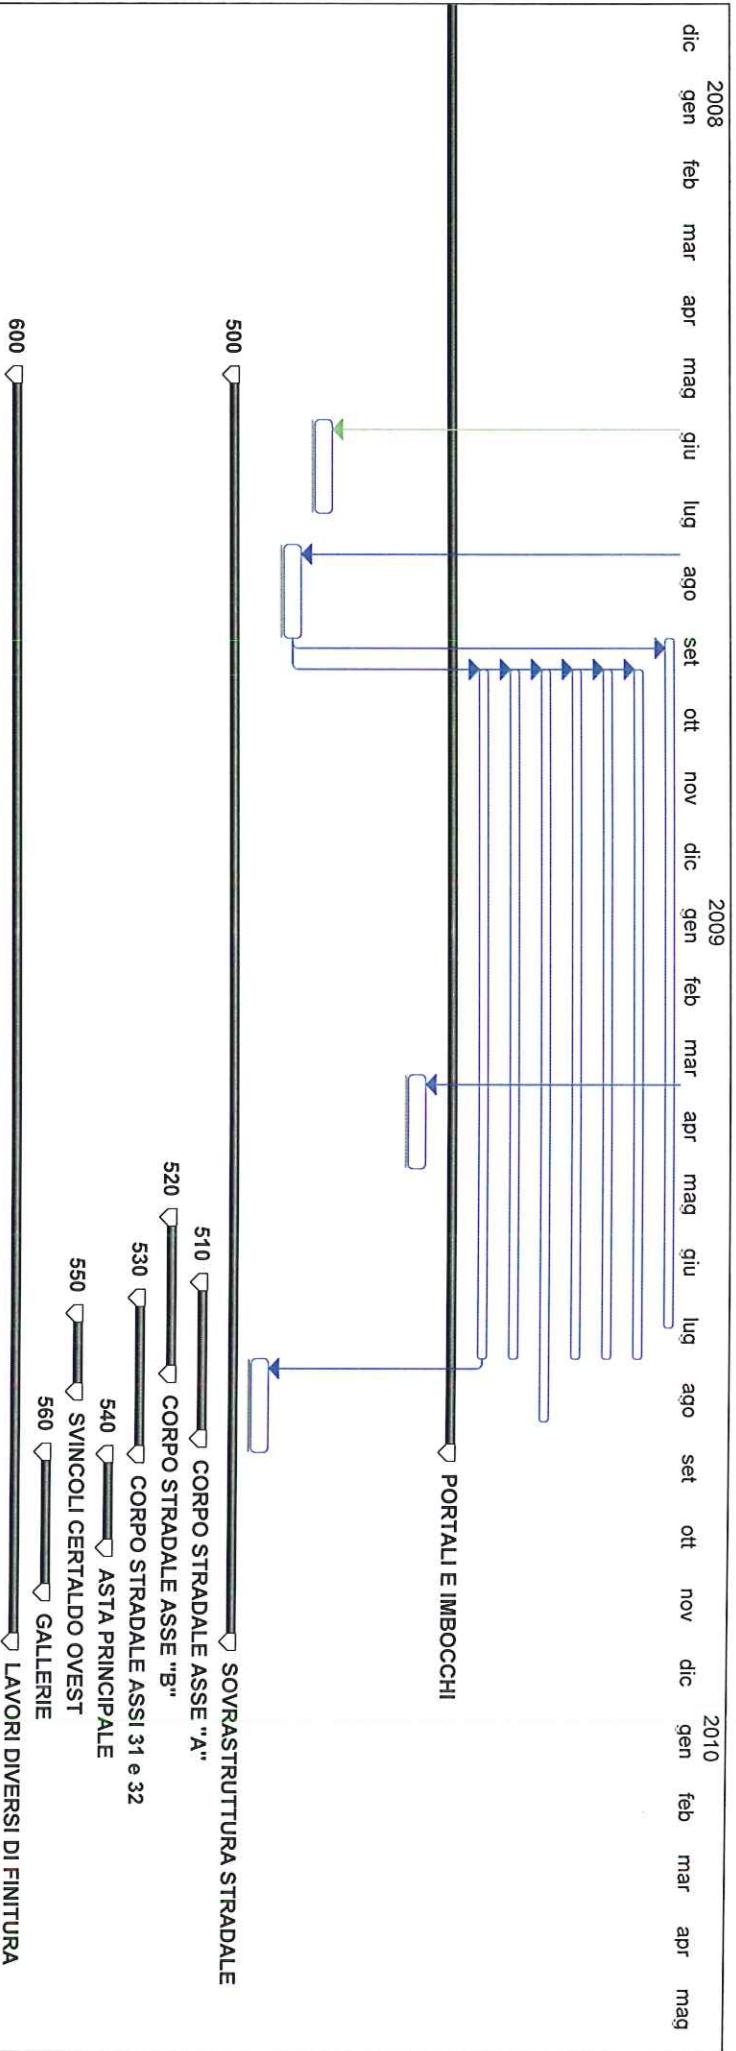

Progetto: Certaldo 17 04 07
Data: mar 10/11/09

Attività	Cardine	Attività esterne
Divisione	Riepilogo	Cardine esterno
Avanzamento	Riepilogo progetto	Scadenza
